



## CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - 2017

*Dr. Juan Luque Mamani*  
Presidente del Gobierno Regional Puno

Puno, junio 2016



## TRANSPORTES



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Carretera Sina – Yanahuaya (tramo III) Sub tramo II (Km. 31.2 - 48.8) y Sub tramo III (Km. 15.84 - 31.2)



<b>Costo Total</b>	<b>S/. 90,732,076</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 61,522,913</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 16,274,906</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 12,934,257</b>
<b>Longitud</b>	<b>Km. 32.96</b>
<b>Tipo de rodadura</b>	<b>Afirmado</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Adm. Directa</b>

**Inicio 2010 y concluye 2017**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Carretera Macusani - Abra Susuya



<b>Costo Total</b>	<b>S/. 39,280,227</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 18,482,767</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 13,541,747</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 7,255,713</b>
<b>Longitud</b>	<b>Km. 26.27</b>
<b>Tipo de rodadura</b>	<b>Carpeta asfáltica</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Adm. Directa</b>

**Inicio 2012 y concluye 2017**



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Carretera Dv. Caracara - Lampa- Cabanilla- Cabanillas Tramo II

Carretera proyectada



**Costo Total**

**S/. 76,311,094**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 35,174,865**

**Presupuesto 2016**

**S/. 20,478,144**

**Programado 2017**

**S/. 20,658,084**

**Longitud**

**Km. 28.66**

**Tipo de rodadura**

**Carpeta  
asfáltica**

**Modalidad de ejec.**

**Contrata**

**Plazo de ejecución**

**450 días**

**Inicio 2012 y concluye 2017**



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Carretera Muñani – Saytocochoa (tramo II) Sub tramo III (Km 30 – Km 56.3)



<b>Costo Total</b>	<b>S/. 184,137,788</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 97,676,068</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 22,952,663</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 27,863,313</b>
<b>Costo del exp. Tec.</b>	<b>S/. 42,492,963</b>
<b>Longitud</b>	<b>26.3 Km.</b>
<b>Tipo de rodadura</b>	<b>Carp. asfáltica</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Contrata</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>270 dias</b>
<b>Inicio 2008 y concluye 2017</b>	



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo – Pisacoma (46.46 Km)



**Costo Total**

**S/. 63,316,415**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 545,276**

**Presupuesto 2016**

**S/. 5,000,000**

**Programado 2017**

**S/. 19,369,166**

**Longitud tramo I**

**Km. 18.98**

**Tipo de rodadura**

**Asfaltado**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

**Plazo de ejecuc.**

**300 dias**

**Tramo II: Kelluyo  
Pisacoma 2018-2019**

**38,401,973**

**Inicio de obra 2016 y concluye 2019**



## SALUD



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Hospital Materno Infantil - Juliaca



Maqueta

**Costo Total**

**S/. 110,242,086**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 13,674,117**

**Presupuesto 2016**

**S/. 5,000,000**

**Programado 2017**

**S/. 31,323,317**

**Modalidad de ejec.**

**Contrata**

**Plazo de ejecución**

**485 días**

**Programado 2018 -  
2019**

**S/. 60,244,652**

L



## AGROPECUARIA



# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca



**Inicio 2015**

<b>Costo Total</b>	<b>S/. 14,451,533</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 1,687,418</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 9,609,887</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 3,154,228</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Adm. Directa</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>330 días</b>

Implementación de 2,086 módulos para mejoramiento genético, manejo de RR.NN, articulación comercial y fortalecimiento de capacidades en fibra de alpaca.

Ámbito de intervención : Carabaya, Lampa, Puno, Chucuito, El Collao, Melgar, Huancané, Sandia, Azángaro, San Antonio de Putina, San Román



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Mejoramiento de la capacidad productiva de carne, lana y leche - Ovino Sur



**Costo Total**

**S/. 8,364,986**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 2,199,521**

**Presupuesto 2016**

**S/. 3,665,266**

**Programado 2017**

**S/. 2,500,198**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

Instalación de 581 módulos demostrativos de pastos cultivados, módulos de cosecha de agua; asistencia técnica especializada en mejoramiento genético de ovinos para mejorar la producción de carne, leche y lana fina

**Inicio 2015**



# AGROPECUARIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN



### Mejoramiento de la capacidad productiva de carne, lana y leche - Ovino Norte



**Costo Total**

**S/. 8,849,441**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 6,763,073**

**Presupuesto 2016**

**S/. 1,482,046**

**Programado 2017**

**S/. 604,322**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

Instalación de 2,746 módulos demostrativos de pastos cultivados, módulos de cosecha de agua; asistencia técnica especializada en mejoramiento genético de ovinos para mejorar la producción de carne, leche y lana fina



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Mejoramiento de la Capacidad Técnica Productiva del Ganado Vacuno Lechero



**Costo Total**

**S/. 22,433,891**

**Ejecutado 2015**

**S/. 19,215,333**

**Presupuesto 2016**

**S/. 16,175**

**Programado 2017**

**S/. 3,202,383**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

**Transferencia tecnológica para la producción y procesamiento de leche**

**Concluye 2017**



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Riego Tecnificado Huancasayani – Ñacoreque (Cuyo Cuyo - Sandia)



**Costo Total**

**S/. 11,209,052**

**Ejecutado 2015**

**S/. 1,643,889**

**Presupuesto 2016**

**S/. 8,262,277**

**Programado 2017**

**S/. 1,302,886**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

01 sistema de captación, construcción de 7.13 Km de línea de aducción, 04 reservorios y el sistema de distribución para incorporar 338 hectáreas bajo riego.

**Inicio 2015**



## ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Seguridad Ciudadana de las Divisiones Policiales de Puno y Juliaca



**Inicio 2013**

<b>Costo Total</b>	<b>S/. 3,304,743</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 608,325</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 0.0</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 2,696,418</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Adm. Directa</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>180 días</b>

Adquisición de 115 motocicletas policiales.



## GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Mejoramiento de la Defensa Ribereña Margen Izquierda y Derecha del Rio Ramis (Tramo I, II y III)



<b>Costo Total</b>	<b>S/. 20,221,021</b>
<b>Ejecutado al 2015</b>	<b>S/. 6,151,592</b>
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>S/. 3,104,707</b>
<b>Programado 2017</b>	<b>S/. 9,882,950</b>
<b>Modalidad de ejec.</b>	<b>Adm. Directa</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>210 dias</b>
<b>Defensa ribereña</b>	<b>Progr. 2018</b>

- Tramo III: Mejoramiento de 7 Km de diques.
- Tramo I y II Concluido.

**Inicio 2013**



## AMBIENTE



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### Instalación y Recuperación de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre



**Inicio 2013**

**Costo Total**

**S/. 10,618,928**

**Ejecutado al 2015**

**S/. 3,086,259**

**Presupuesto 2016**

**S/. 2,300,000**

**Programado 2017**

**S/. 2,882,747**

**Modalidad de ejec.**

**Adm. Directa**

**Plazo de ejecución**

**05 años**


Instalación de plántones forestales en 2,200 hectáreas, producción de 2,822,600 plántones y 25,758 familias beneficiadas.



# PROCOMPITE Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

## PROCOMPITE y ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN - 2017

<b>PROCOMPITE</b>	<b>S/. 4,293,865</b>
<b>ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN</b>	<b>S/. 2,500,000</b>
<b>Total (S/.)</b>	<b>S/. 6,793,865</b>

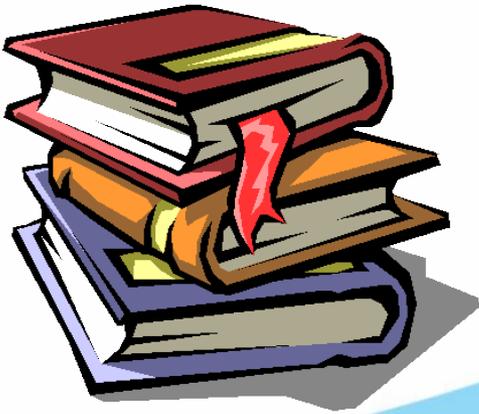



## Continuidad de Proyectos de Inversión en Ejecución 2017

Transporte	S/. 88,080,534
Salud	S/. 31,323,317
Agropecuario	S/. 10,764,018
Orden Público, Seguridad y Defensa Ribereña	S/. 12,579,368
Ambiente	S/. 2,882,747
PROCOMPITE	S/. 4,293,865
Estudios de Pre Inversión	S/. 2,500,000
<b>TOTAL (S/.)</b>	<b>S/. 152,423,849</b>



***Gracias por su atención...***
