



REGIÓN PUNO

GOBERNACIÓN
REGIONAL

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
FEBRERO DEL 2019**

Lunes, 04 de marzo del 2019



Al 28 de febrero del 2019, la ejecución de la Inversión Pública del Gobierno Regional Puno, liderada por el gobernador regional Walter Aduviri Calisaya, muestra una eficiencia en ejecución financiera acumulada de S/ 15.7 millones de soles a nivel de todas las Unidades Ejecutoras, el cual refleja un avance del **7.1%** del PIM.

Unidad Ejecutora	ENE-FEB-2019 (60 DIAS) -PER-WAC			ENE-FEB-2015 (60 DIAS) -PER-JLM			Variación Porcentual (2019 -2015)	Variación Absoluta (2019 -2015)
	PIM	Ejecución	% Avance	PIM	Ejecución	% Avance		
GORE-PUNO	219.4	15.7	7.1%	233.1	2.1	0.9%	645%	13.6
Total	219.4	15.7	7.1%	233.1	2.1	0.9%	645%	13.6

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas


Fuente: Consulta amigable – SIAF. Al 28 de febrero del 2019. Hora de consulta: 09:00 am

*Al 28 de febrero del 2018.



A nivel de todas las Unidades Ejecutoras, la ejecución financiera acumulada al mes de febrero del presente año es de S/ 15.7 millones, registrando un incremento del **645%**, en relación al mismo período del año 2015, se puede apreciar un récord histórico de ejecución al segundo mes de gestión, respecto a los dos primeros meses de la gestión de anteriores gobernadores Mauricio Rodríguez y Juan Luque.

Este resultado es el esfuerzo del Gobernador Regional Walter Aduviri y su equipo de profesionales que se caracterizará por mostrar resultados.

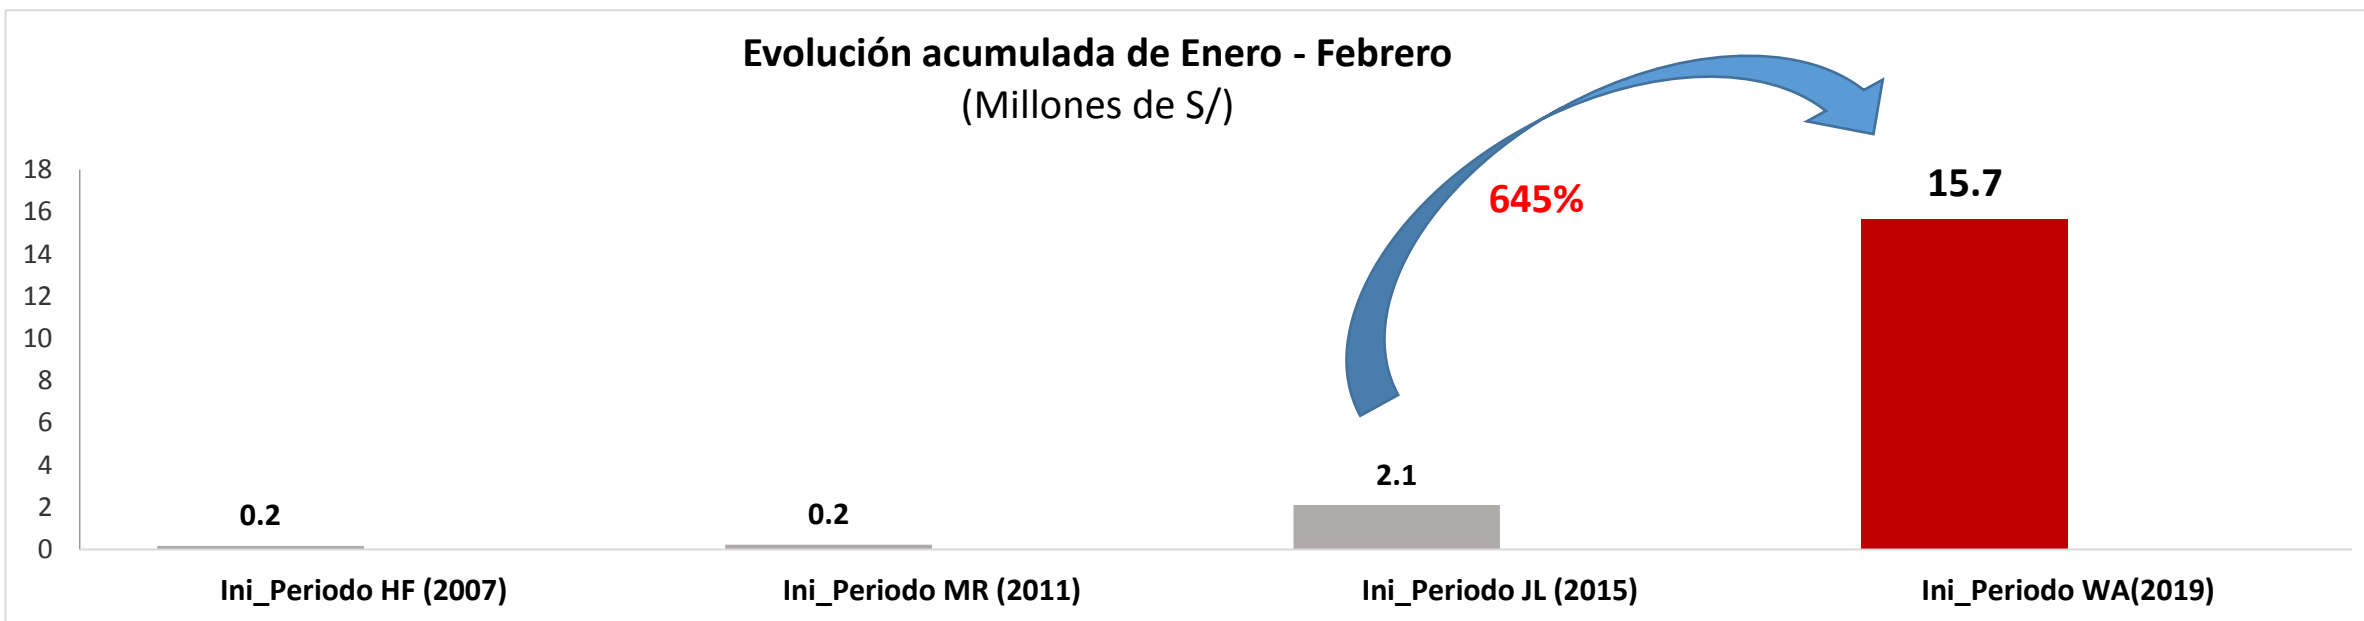

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas

Consulta amigable – SIAF.

*Datos desde el 01 al 28 de febrero, 2007, 2011, 2015 al 2019



El proyecto con mayores recursos programado para el presente año es el Hospital de Ilave con S/ 34.3 millones, el cual, a la fecha, ha ejecutado un total de S/ 6.1 millones, representando un avance del 18% respecto de su PIM.



El ranking de ejecución regional nos muestra que la Región Puno se encuentra en el cuarto lugar del porcentaje de ejecución (7.1%) respecto del PIM, proyectándose que para el mes de marzo la ejecución financiera logrará records de ejecución nunca antes vistos en gestiones anteriores.

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES	7,897	2,135	393	5%
REGION	PIM	CERT.	DEV.	% AVAN.
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	278	208	118	42.6%
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	366	87	32	8.9%
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	170	109	13	7.6%
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	219	154	16	7.1%
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	80	69	5	6.3%
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	268	83	14	5.3%
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	790	71	41	5.2%
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	317	173	16	5.0%
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	488	49	21	4.3%


FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas

Consulta amigable – SIAF.

*Datos al 28 de febrero del 2019



En cuanto a las funciones, la función transporte cuenta con el mayor número de recursos para inversión, representando el 30% el cual ha ejecutado el 7% de sus recursos (S/ 5.67 millones), seguido por el sector salud con el 27% de recursos asignados en donde ya se ha ejecutado el 11% (S/ 7.16 millones), la función agropecuaria cuenta con el 16% de PIM total a nivel regional, seguido por la función educación (15%).

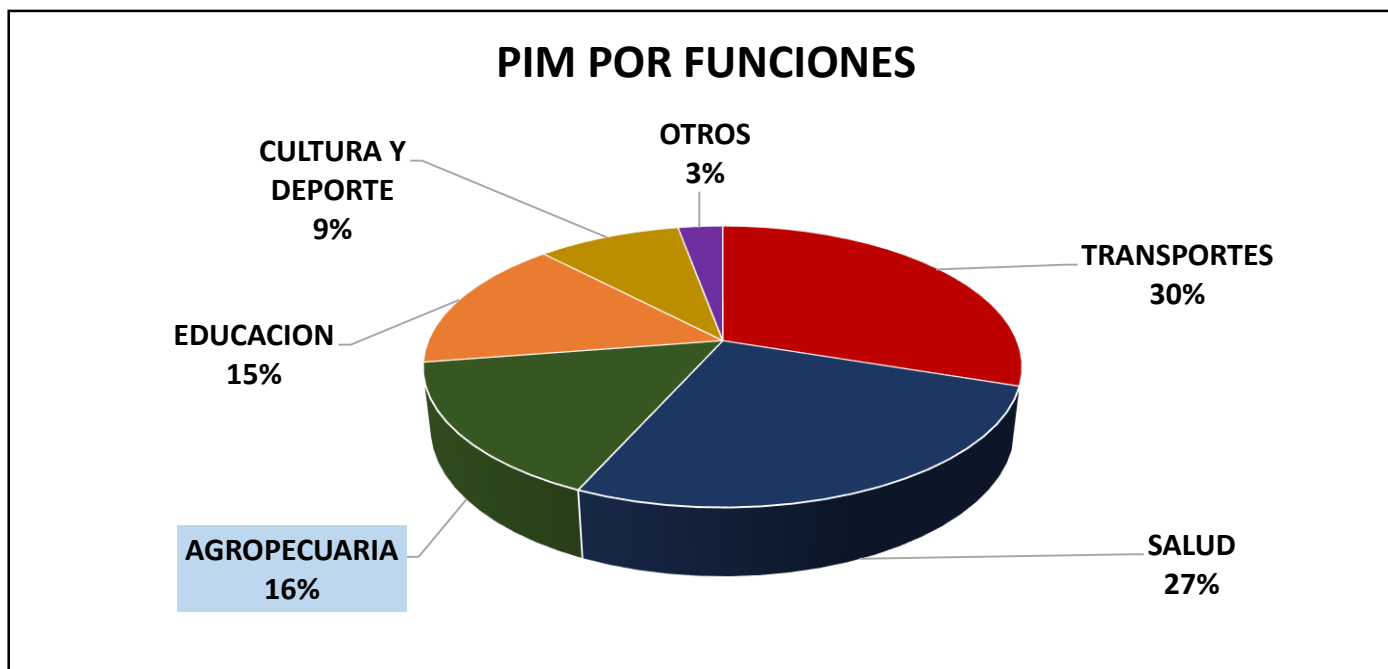

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas

Consulta amigable – SIAF.

*Datos al 28 de febrero del 2019



Cabe resaltar que la gestión de Walter Aduviri pondrá énfasis al desarrollo de la industria agropecuaria, en donde los 2 proyectos más importantes son: “Tecnificación para la cadena productiva de la leche (PIM S/ 14.10 millones)” y “Mejoramiento de la cadena de valor de fibra de alpaca (PIM S/ 9.68 millones)”, ambos proyectos vienen realizando ejecución financiera con ligeros avances. Estos y otros proyectos comenzarán a ejecutarse física y financieramente con mucha más fuerza en las siguientes semanas.



En el sector transportes ya se vienen realizando las obras en el “Proyecto de la carretera, Arapa, Chupa, Huancané”, proyecto que ya ha ejecutado S/ 1, 5 millones. Por otro lado, el “Proyecto carretera Lampa – Cabanilla – Cabanillas” también viene realizando las labores de obra, este proyecto a la fecha viene ejecutando un total de S/ 1, 6 millones. Otro proyecto en este sector que ya viene realizando ejecución de obras es el “Proyecto de la carretera Pampa Blanca – Rinconada – Cerro Lunar” con una ejecución financiera de S/ 1.6 millones.



En el sector salud, tal como se mencionó líneas arriba, la ejecución física y financiera del Hospital de Llave se viene llevando con normalidad, por otro lado, en este sector, ya se vienen realizando las acciones de obra del Hospital Materno Infantil, proyecto que al 28 de febrero ha ejecutado S/ 1 millón, referente a este, se proyecta ejecutar tanto física como financieramente la tercera parte en el próximo mes.

Respecto al sector educación, este sector próximamente comenzará con la ejecución física y financiera con fuerza, a fin de brindar una adecuada infraestructura para las clases en las escuelas y colegios de nuestra región.



REGIÓN PUNO

GOBERNACIÓN
REGIONAL

GRACIAS!!!

GOBERNACIÓN REGIONAL

**WALTER ADUVIRI CALISAYA
GOBERNADOR REGIONAL**

Lunes, 04 de marzo del 2019
