



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
**PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE**



**EVALUACION PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL**  
**SEMESTRAL**  
**EJECICIO FISCAL 2023**

---

**ABOG. RICHARD HANCCO SONCCO**  
**GOBERNADOR REGIONAL**

**ING. JOSUE QUISPE CAPAJAÑA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**PUNO – PERU**  
**2023**





## PRESENTACION.

La evaluación Presupuestal semestral tiene por finalidad analizar los resultados de la ejecución de Ingresos y Gastos por Partidas genéricas, actividades y proyectos el transcurso de los seis primeros meses del año fiscal, esta evaluación se ha elaborado en cumplimiento de la ley Nro 31638 – ley del presupuesto del sector público para el para el año fiscal 2023.

El objetivo de la Evaluación Presupuestaria es medir el comportamiento de los ingresos y gastos determinando su grado de eficacia y eficiencia al finalizar el primer semestre del año fiscal. Asimismo, nos permite examinar los resultados obtenidos al primer semestre de este ejercicio fiscal 2023. Cabe mencionar que la evaluación es una herramienta que nos permite medir las distorsiones que se ha asignado.

Por ello, siendo una de las funciones de la Dirección de Planificación y Presupuesto, el de asesorar la utilización de los recursos económicos, conforme a lo previsto, motivo por el cual los resultados de esta evaluación servirá para tomar medidas correctivas, que la administración del Gobierno Regional recogerá para seguir trabajando por una región saludable en los ámbitos de riego y drenaje, reafirmando el compromiso y las firme convicción que nuestra dedicación consolidara el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida y tranquilidad de la población.





## INDICE

I.	ASPECTOS	
	GENERALES.....	4
1.1.	VISION.....	4
1.2.	MISION.....	4
1.3.	OBJETIVOS.....	5
II.	ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL PIA, PIM Y EJECUCION DE EGRESOS, POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN GENERALICA DE GASTO.....	5
III.	COMENTARIO DEL AVANCE FISICO FINANCIERO EN BASE A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION (POR COMPONENTES) DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.....	7
IV.	PRESENTACION PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CON UN MONTO MAYOR O IGUAL A S/800,000.00.....	11
V.	IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS.....	21
VI.	PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS.....	22
	ANEXO.....	23





## I. ASPECTOS GENERALES.

### 1.1. VISION.

#### VISION REGIONAL:

Región Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo, al 2021, somos una región con identidad andina que maneja sostenible con sus recursos naturales y el ambiente, con una producción agropecuaria, minera – energética competitiva. Líder en el desarrollo de camélidos sudamericanos, truchas, granos andinos, bovinos y el turismo articulado

#### VISION INSTITUCIONAL:

“PRORRIDRE, líder nacional en propiciar el incremento de producción agropecuaria de calidad integral, sostenible sustentable, contribuyente significativamente al bienestar económico social de la población, con tecnología competitiva (empresarios competitivos), organizando en cadenas productivas que permitan el desarrollo de una sociedad humanista, que garantice una vida digna para todos los productores.

### 1.2. MISION

#### MISION DEL GOBIERNO REGIONAL:

El Gobierno Regional Puno, es una institución pública que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.

#### MISION INSTITUCIONAL

Promover y contribuir el desarrollo integral sostenible de la actividad agropecuaria, mediante el uso racional de los recursos: agua y suelo, con ejecución de obras hidráulicas de infraestructura de riego, a fin de elevar el nivel de producción y productividad agropecuaria.





### 1.3. OBJETIVOS.

- a) Apreciar el desempeño en su Gestión Presupuestaria Institucional correspondiente al primer semestre.
- b) Efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los Programas Presupuestales para verificar el cumplimiento de las metas de resultados y de productos a favor de la población objetivo.

## II. ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL PIA, PIM, EJECUCION DE INGRESOS, SEGÚN GENERICA DE INGRESO.

Cuadro Nº 01

### Ejecución de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Fin.Fin. Rubro Cen	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0.93	-0.93	0.00	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0.93	-0.93	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE				0.93	-0.93	0.00	0.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				303,167.22	-303,167.22	0.00	0.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				303,167.22	-303,167.22	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE				303,167.22	-303,167.22	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				5,468.49	-5,468.49	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				5,468.49	-5,468.49	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE				5,468.49	-5,468.49	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	32,931,420		32,931,420	23,509,792.35	9,421,627.64	71.39	71.39
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	32,931,420		32,931,420	22,865,805.70	10,065,614.30	69.43	69.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,931,420		32,931,420	22,811,663.35	10,119,756.65	69.27	69.27
1.5 OTROS INGRESOS				54,142.35	-54,142.35	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS				643,986.66	-643,986.66	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS				38,793.58	-38,793.58	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE				605,193.08	-605,193.08	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,931,420</b>		<b>32,931,420</b>	<b>23,819,429.00</b>	<b>9,111,991.00</b>	<b>72.33</b>	<b>72.33</b>

#### Recursos directamente Recaudados

En lo que concierne a los recursos directamente recaudados se tiene una ejecución según PIM es de S/. 0.00 (cero soles con 00/100 soles), y podemos mencionar que los indicadores de eficacia respecto al PIA y PIM son nulos.

#### Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito



Los indicadores de eficacia respecto al PIA es nulo, y el indicador con respecto al PIM son nulos; según la ejecución de ingresos fue de S/303,167.22 (trescientos tres mil ciento sesenta y siete con 22/100 soles).

### **Donaciones y Transferencias**

Para la fuente de financiamiento donaciones y transferencias las recaudaciones son nulas esto debido a que no se tiene presupuesto en el PIA como en el PIM.

### **Fondo de Compensación Regional - FONCOR**

El indicador de eficacia respecto al PIA es de 69.43%, el indicador con respecto al PIM es de 69.43% esto debido a que en el PIA Y PIM son S/32,931.420.00 ( treinta y dos millones novecientos treinta y un mil cuatrocientos veinte con 00/100 soles) con una ejecución de ingresos de S/23,509,792.70 (veinte tres millones quinientos nueve mil setecientos noventa y dos con 70/100 soles).

### **Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y**

Los indicadores de eficiencia respecto al PIA son nulos juntamente con la eficiencia del PIM siendo nulas.





**III. COMENTARIO DEL AVANCE FISICO FINANCIERO EN BASE A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION (POR COMPONENTES) DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.**

Cada proyecto tiene entre uno o más metas presupuestales donde se identifican según cada proyecto:

A) 2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

- Meta presupuestal 0031 "CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES" tiene un avance físico de 80.00%
- Meta presupuestal 0053 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00

B) 2196555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO.

- Meta presupuestal 0027 "ELABRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" tiene un avance físico de 27.00.

C) 2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO.

- Meta 0032 "CONSTRUCCION DE RESERVORIO" tiene un avance físico de 5.97.
- Meta 0038 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 100.00.
- Meta 0054 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00

D) 2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.

- Meta 0039 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 100.00 %





- Meta 0045 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 100.00 %.
- E) 2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO.
- Meta 0044 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00.
- F) 2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.
- Meta 0001 "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA" tiene un avance físico de 0.00.
  - Meta 0002 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 48.35.
  - Meta 0003 "GESTION AMBIENTAL" tiene un avance físico de 0.00.
  - Meta 00020 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 6.76.
- 2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO.
- Meta 0004 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA" tiene un avance físico de 38.31.
  - Meta 0017 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 57.20.
  - Meta 0019 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 100.00
  - Meta 0047 "CAPATACION Y ASISTENCIA TECNICA" tiene un avance físico de 0.00
  - Meta 0048 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00







H) 2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0026 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 73.01.
- Meta 0036 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 100.00.
- Meta 0040 "GESTION AMBIENTAL" tiene un avance físico de 100.00.
- Meta 0046 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00.

I) 2435576: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0005 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 21.36.
- Meta 0006 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0018 "CONSTRUCCION DE RESERVORIO" tiene un avance físico de 41.19.
- Meta 0041 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 1.00%
- Meta 0050 "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0051 "GESTION AMBIENTAL" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0052 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 0.00

J) 2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0007 "CONSTRUCCION DE REPRESA" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0008 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0021 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS" tiene un avance físico de 95.00 %





K) 2470845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TAHUACO Y MACHACMARCA DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0009 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 0.00%.
- Meta 0010 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0022 "ELABORACION DE EXPEDINETES TECNICOS" tiene un avance físico de 100.00

L) 2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0011 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico 0.00.
- Meta 012 "GESTION DE PROYETOS DE INVERSION" tiene un avance físico 0.00.
- Meta 0025 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO" tiene un avance físico de 100.00.

M) 2477103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO CHOCCOPAMPA, MOLINO KAPIA, ILLECA MOLINO Y CAMIRAYA MOLINO DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0013 "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un como avance físico de 0.00.
- Meta 0014 "GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0023 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" tiene un avance físico de 100.00

N) 2505774: CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO





- Meta 0015 "COSTRUCION DE SISTEMA DE RIEGO" tiene un avance físico de 0.00.
- Meta 0016 "GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION" tiene un avance físico de 0.00.
- 0043 "LIQUIDACION DE OBRAS" tiene un avance físico de 100.00 %

O) 2540745: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

- Meta 0024 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" tiene un avance físico de 60.00 %.





**IV. PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON UN MONTO MAYOR O IGUAL A S/800.000.00 SOLES, SEGÚN FORMATO NRO 002**

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0.00	262,360.00	17,614.91	6.71

**a) Logros Obtenidos.**

En el primer semestre del año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura - PIA de S/0 (cero con 00/100 de soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/262,360.00 (doscientos sesenta y dos mil trescientos sesenta con 00/100 soles) y una ejecución de devengado de S/17,614.91 (diez y siete mil seis cientos catorce con 91/100 soles) dando una ejecución del 6.71%



**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2196555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0.00	400,000.00	112,415.29	28.10

**a) Logros Obtenidos.**



En el primer semestre del año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura - PIA de S/0 (cero con 00/100 de soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/400,000.00 (cuatrocientos mil con 00/100 soles) y una ejecución de devengado de S/112,415.29 (doce mil cuatrocientos quince con 29/100 soles) dando una ejecución del 28.10%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0	440,775.00	329,303.14	74.71

**a) Logros Obtenidos.**

En el primer semestre del año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/0 (cero con 00/100 de soles) con un presupuesto institucional modificado de S/440,775.00 (cuatrocientos cuarenta mil setecientos setenta y cinco con 00/100 soles) y una ejecución de S/329,303.14 (trescientos veinte nueve mil trescientos tres con 14/100 soles) dando un avance de 74.71%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
	PIA	PIM	EJECUCION	%
TOTAL				



			DEVENGADO	EJEC/PIM
TOTAL	0	49,037.00	41,882.66	85.41%

a) **Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/0 (cero con 00/100 de soles) con un presupuesto institucional modificado de S/49,037 (cuarenta y nueve mil treinta y siete con 00/100 soles) y una ejecución de S/41,882.66 (cuarenta y un mil ocho cientos ochenta y dos con 66/100 soles) dando un avance del 85.41%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0	31,255.00	0	0%

a) **Logros Obtenidos.**

En el primer semestre del año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/0 (cero con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/31,255 (treinta y un mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) con una ejecución de S/0 (cero con 00/100 soles) dando una ejecución de 0%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO.



EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
			DEVENGADO	EJEC/PIM
TOTAL	2,500,180.00	3,643,342.00	1,919,012.86	52.67

a) **Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/2,500,180.00 (dos millones quinientos mil ciento ochenta con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado de – PIM de S/3,643,342.00 (tres millones seis cientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y dos con 00/100 soles) con una ejecución de S/1,919,012.00 (un millón novecientos diez y nueve mil doce 00/100 soles) dando una ejecución de 52.67%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
			DEVENGADO	EJEC/PIM
TOTAL	4,200.00	8,369,766.00	3,390,165.24	40.50%

a) **Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/4,200,000.00 (cuatro millones doscientos mil con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/8,369,766.00 (ocho millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y seis con 00/100 soles) y una ejecución de S/3,390,165.24 ( tres millones trescientos noventa mil ciento sesenta y cinco con 24/100 soles) dando un avance de 80.72%.



**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0.00	2,812.939.00	1,931,818.22	68.68

a) **Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/0 (0 con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado de S/2,812,939.00 (dos millones ocho cientos doce mil novecientos treinta y nueve con 00/100 soles) y una ejecución de S/1,931,818.22 (un millón novecientos treinta y u mil ocho cientos diez y ocho con 22/100 soles) dando un avance del 68.68%



**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2435576: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	4,000,000.00	15,218,123.00	9,123,346.73	59.95

a) **Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/4,000,000.00 (cuatro millones con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado S/15,218,123.00 (quince millones doscientos diez y ocho mil ciento veinte tres con 00/100 soles) y una ejecución de S/9,123,346.73 (nueve





millones cientos veinte tres mil trescientos cuarenta y seis con 73/100 soles) dando una ejecución de S/59.95%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	5,231,240.00	232,938.00	22,118.39	9.50

**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/5,231,240.00 (cinco millones doscientos treinta y un mil doscientos cuarenta con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/232,938.00 (doscientos treinta y dos mil novecientos treinta y ocho con 00/100 soles) y una ejecución de S/22,118.39 (veinte dos mil ciento diez y ocho con 39/100 soles) dando un avance de 9.50%.



**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2470845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TAHUACO Y MACHACMARCA DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	4,000,000.00	17,655.00	3,568.00	20.21



**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/4,000,000.00 (cuatro millones con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/17,655.00 (diez y siete mil seis cientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) y una ejecución de S/3,568.00 (tres mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 soles) dando un avance de 20.21%.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	5,000,000.00	1,305,505.00	39,408.38	3.02

**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/5,000,000.00 (cinco millones con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/1,305,505.00 (un millón trecientos cinco mil quinientos cinco con con 38/100 soles) y una ejecución de S/39,408.38 ( treinta y nueve mil cuatrocientos ocho con 38/100 soles) dando un avance de 3.02 %.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2477103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO CHOCCOPAMPA, MOLINO KAPIA, ILLECA MOLINO Y CAMIRAYA MOLINO DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO



EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	4,000,000.00	42,062	27,188.49	64.64%

**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/4,000,000.00 (cuatro millones con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado – PIM de S/42,062.00 (cuarenta y dos mil sesenta y dos con 00/100 soles) y una ejecución S/27,188.49 (veinte siete mil ciento ochenta y ocho con 49/100 soles) con un avance de 64.64 %.

**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2505774: CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
PRESUPUESTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	0	28,207.00	28,200.00	99.98

**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/0.00 (cero con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado de S/28,207.00 (veinte ocho mil doscientos siete con 00/100 soles) y una ejecución de S/28,200.00 (veinte ocho mil doscientos con 00/100 soles) dando una ejecución de 99.98%.



**ENTIDAD:** 99458 - GOBIERNO REGIONAL PUNO.

**DIRECCION / UNIDAD EJECUTORA:** PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

**PROYECTO:** 2540745: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO.

EJERCICIO FISCAL	2023			
	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	% EJEC/PIM
TOTAL	4,000,000.00	77,476.00	45,628.34	58.89%

**a) Logros Obtenidos.**

En el año 2023 dicho proyecto tuvo un presupuesto institucional de apertura – PIA de S/4,000,000.00 (cuatro millones con 00/100 soles) con un presupuesto institucional modificado de S/77,476.00 (setenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 soles) y una ejecución de S/45,628.34 (cuarenta y cinco mil seiscientos veinte ocho con 34/100 soles) y un avance de 58.89%.





## V. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS.

Los problemas presentados en el Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE en relación de las funciones mediante proyectos y/o actividades permanentes, son los siguientes:

La información física de las obras de inversión, proyectos y actividades carece de directivas en ejecución de obras por administración directa y obras por contrata origina presupuestos adicionales al no ser compatibilizados con su expediente técnico y obras en sitio en su plazo de compatibilidad. Así mismo no se cumplen las metas físicas de acuerdo al plan, expediente técnico de las obras de inversión, actividades y proyectos.

- Los apoyos comunales sin directiva de las poblaciones civiles y representadas, mediante los tenientes alcaldes de la Provincias y Distritos a nivel Regional solicitan constantemente los apoyos comunales para sus actividades y otros para sus mejoras y/o implementaciones de su Riego y Drenaje. Por considerarse un derecho de años anteriores, generándose un obligación y presión a la gerencia de planificación y presupuesto su disponibilidad presupuestal.
- La inoportuna atención de los requerimientos en lo que respecta a las maquinarias pesadas por parte de la oficina de abastecimientos, fueron las grandes limites para el logro programado para el avance de la ejecución física.
- Las obras tuvieron inconvenientes para realizar los trazos de apertura de accesos debido a que los terrenos no se encontraban saneados, limitando el traslado de materiales GEOSINTETICOS en los plazos programados.
- Los factores climáticos también fueron limitando el normal avance de los trabajos en obra, lo cual contribuye al no cumplimiento de la ejecución física programada.
- Las fallas mecánicas de las maquinarias contratadas que se encuentran en obra, aunado al desabastecimiento de combustible para las mismas, perjudicando el cumplimiento físico programado.
- Falta de asignación presupuestal por lo que se tuvo que paralizar la obra generando un incumpliendo en el avance físico programado.





## VI. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

- Coordinación con la oficina de abastecimientos para la oportuna atención de requerimientos, en cuanto a los factores climáticos, se viene aprovechando al máximo las horas que favorecen los trabajos, incluso en algunas ocasiones se prolongaron las horas diarias laborales.
- Se realizan trabajos de sensibilización a favor del proyecto, llegando a acuerdos con la población involucrada al proyecto, básicamente en la operación y mantenimiento de la infraestructura para la sostenibilidad respectiva.
- Se realizarán trabajos constantes de revisión y mantenimientos de maquinaria.
- Cuando se tengan deficiencias en situación de asignación presupuestal se sugiere paralizar la obra con el fin de no generar mayores gastos.





# ANEXO






SE OBSERVA LA REAZILACION DE SUPERVICION DEL MEJROAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA.

OBRA CON NRO. 2160311 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO"





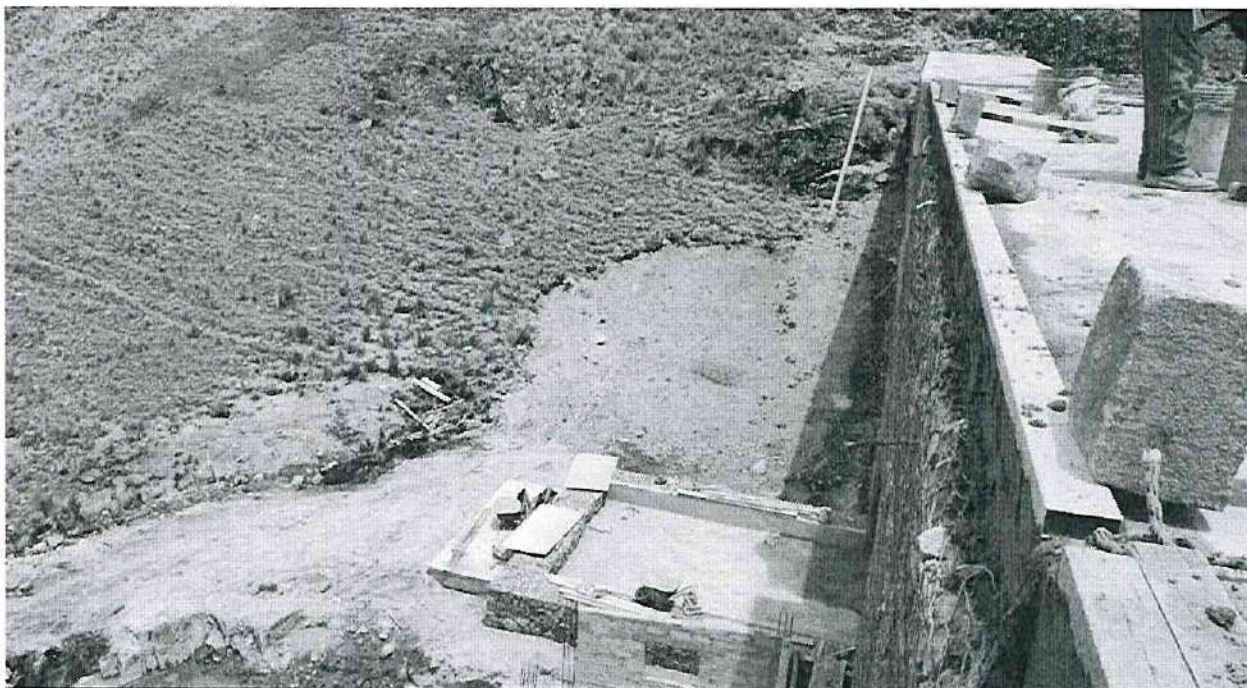

SE OBSERVA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

OBRA CON CUI NRO. 2232347 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO"





SE OBSERVA UNA CHARLA CON LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA

OBRA CON CUI NRO. 2232347 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO"





20 dic 2022 2:38:07 p. m.  
Distrito de Umachiri  
Melgar  
Puno

SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO SUS LABORES PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA.

OBRA CON CUI NRO. 2232349 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO"






SE OBSERVA A LA MAQUINARIA REALIZANDO ESCABACION PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

OBRA CON CUI NRO. 223234 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO"



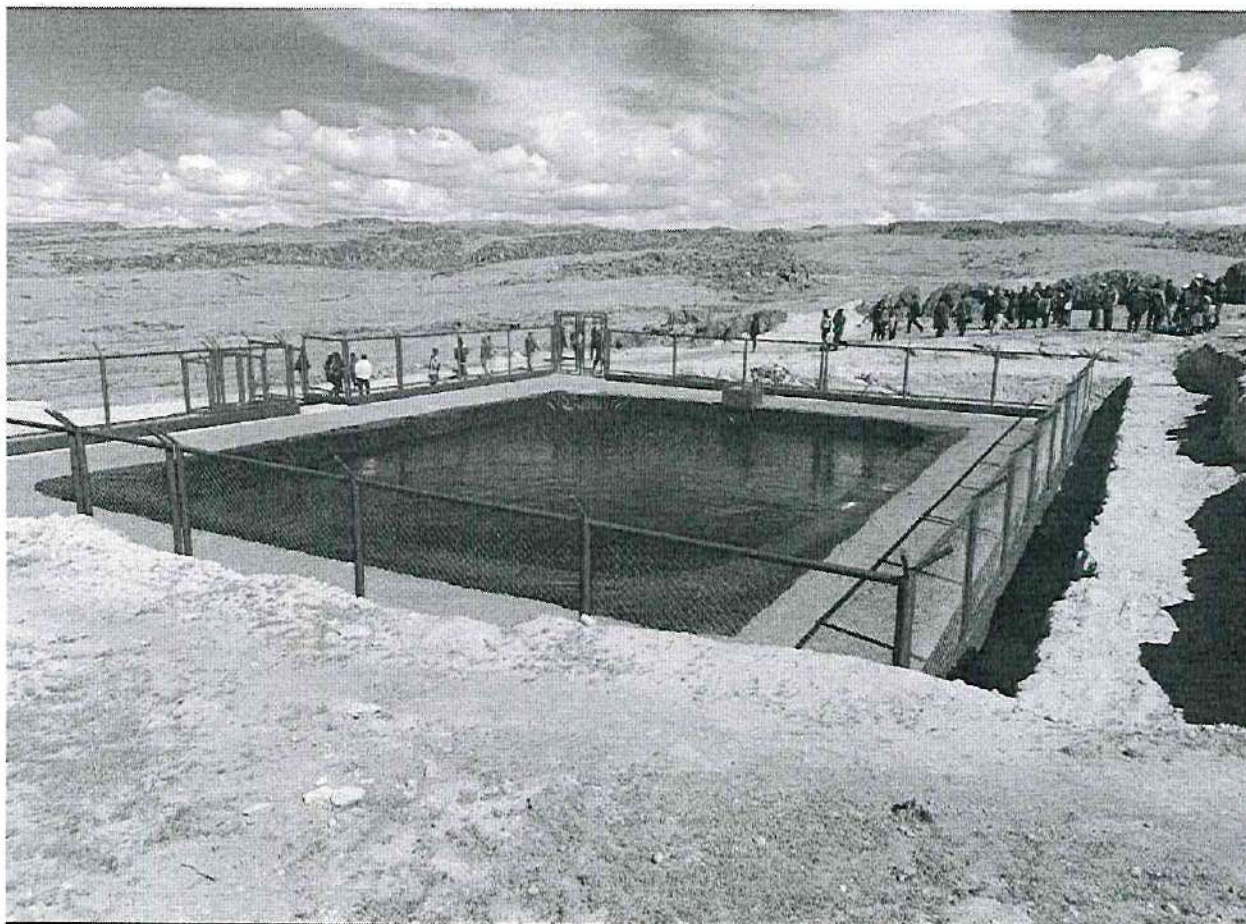

SE OBSERVA EL SERVICIO DE RIEGO

OBRA CON CUI NRO. 2250868 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO"






SE OBSERVA AL PERSONAL OBRERO EN PLENA EJECUCION DEL SISTEMA DE RIEGO.


OBRA CON CUI NRO. 2250868 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO"



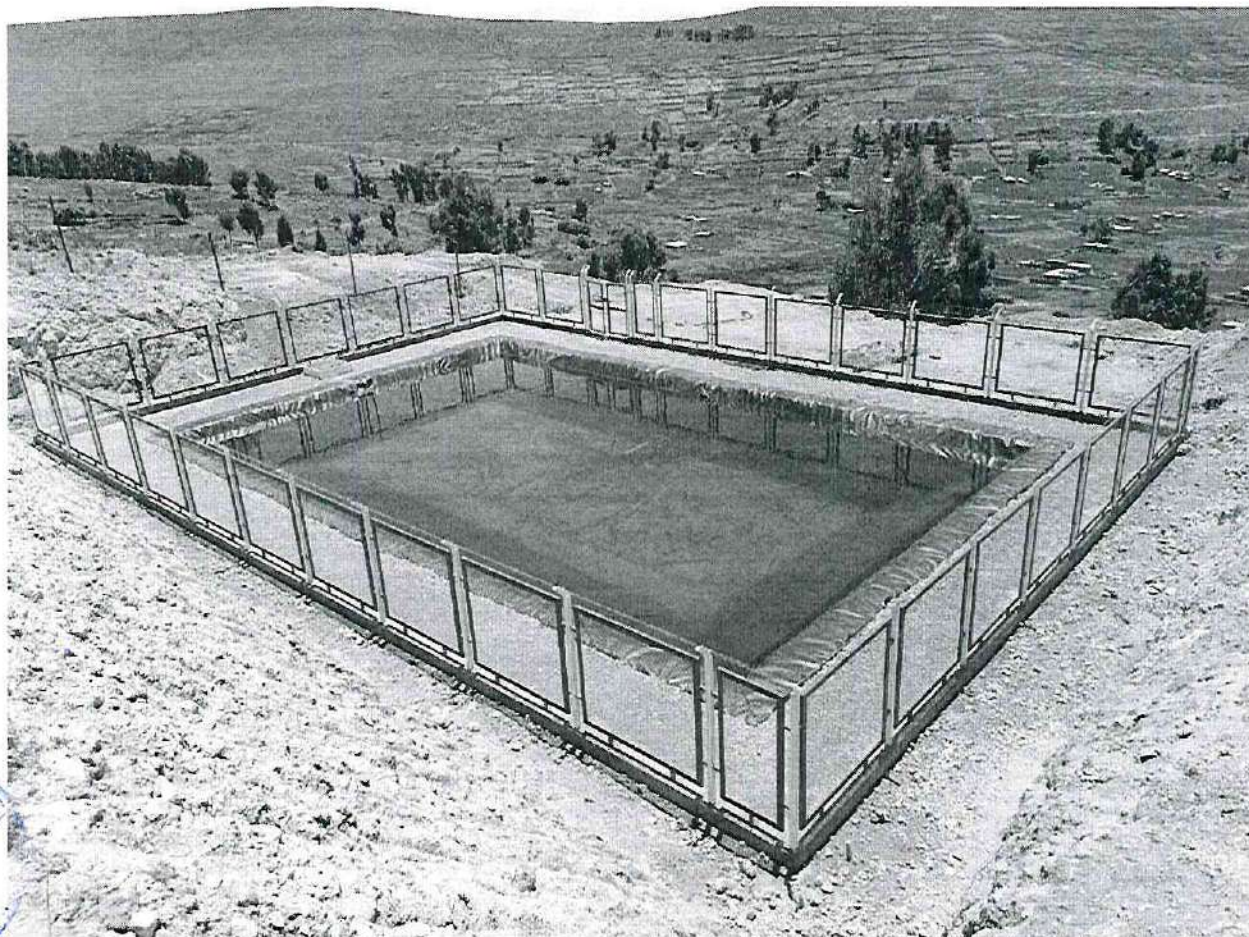

SE OBSERVA EL RIEGO PARA LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA

OBRA CON CUI NRO. 2305521 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO"

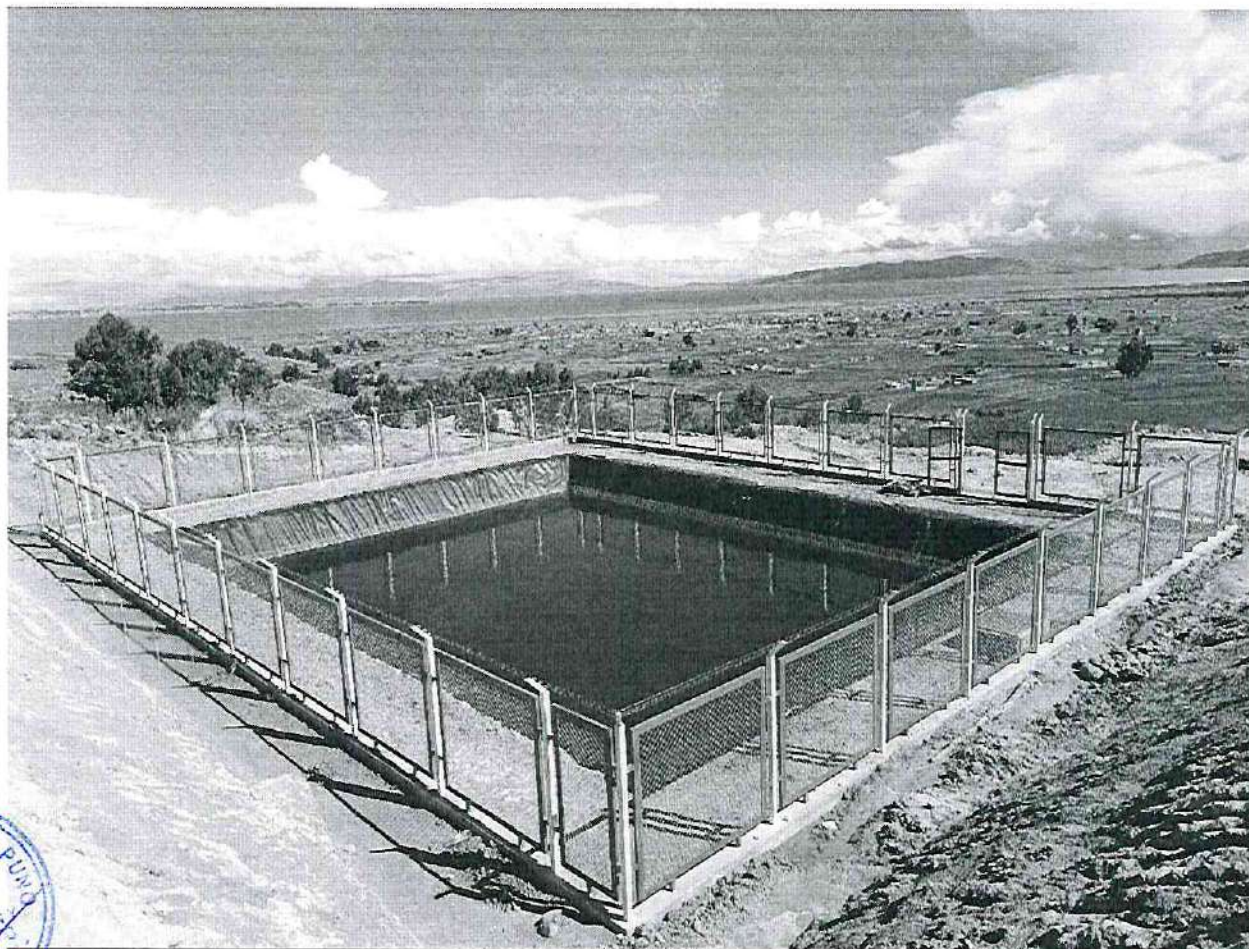

SE OBSERVA EL RIEGO PARA LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA

OBRA CON CUI NRO. 2305521 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO"








SE OBSERVA AL PERSONA OBRERO EJECUTANDO EL RIEGO TECNIFICADO

OBRA CON CUI NRO. 2357498 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO".

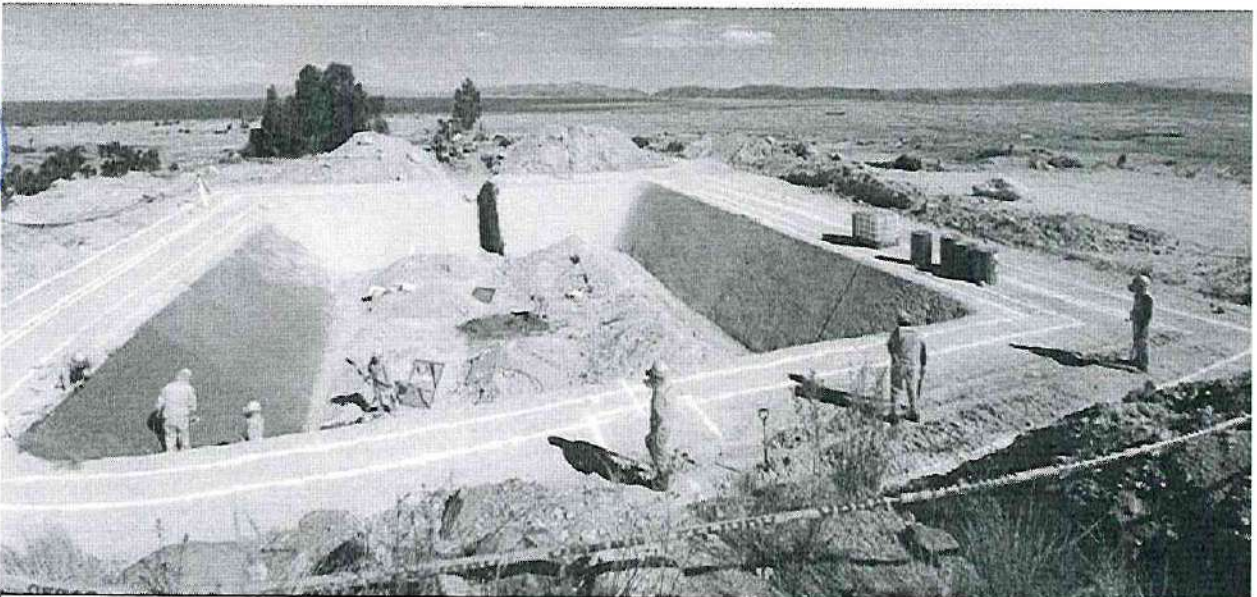

SE OBSERVA AL PERSONA OBRERO EJECUTANDO EL RIEGO TECNIFICADO

OBRA CON CUI NRO. 2357498 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO".





SE OBSERVA REALIZANDO LA SUPERVICIO DE LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUAPARA EL SISITEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO

OBRA CON CUI NRO. 2429723 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"





SE OBSERVA A LA MAQUINARIA REALIZANCO UNA ESCABACION APRA LA REALIZACION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO

OBRA CON CUI NRO. 2429724 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO"





SE OBSERVA A LOS INGENIEROS CON UN FLUJO DE AGUA SALIENDO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO.

OBRA CON CUI NRO. 2429724 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO"






SE PUEDE OBSERVAR AL SOLDADOR, SOLDANDO LAS REJILLAS PARA EL ALREDEDOR DEL SISTEMA DE RIEGO

OBRA CON CUI NRO 2435576 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO"



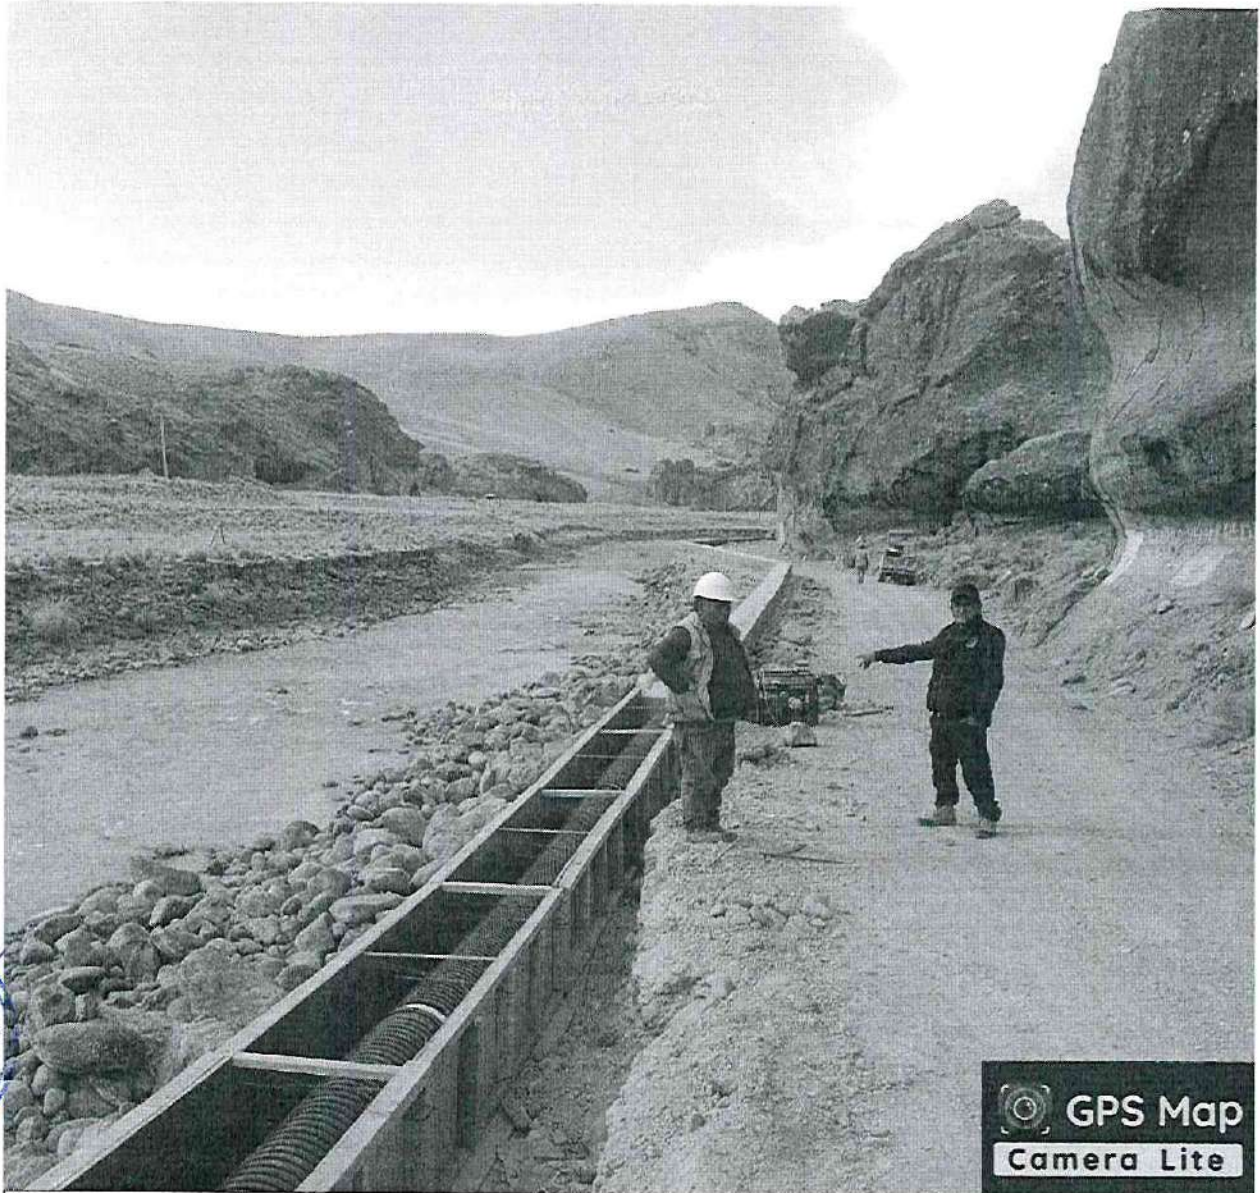

SE OBSERVA A LA TUBERIA DEL LA CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS

OBRA CON CUI NRO 2505774 "CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO"



PODEMOS OBSERVAR A LOS INGENIEROS CON LA BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION;  
REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL  
SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS

OBRA CON CUI NRO 2505774 "CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION;  
REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL  
SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO  
Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO"

